

إدارة المشاريع

Project Management

المحاضرة الحادية عشرة: البنية التنظيمية للمشاريع

Project Organizational Structure

الدكتور إياد زوكار

- التعرف على مفهوم البنية التنظيمية ومكان المشاريع ضمنها
- التعرف على مختلف أنواع البنى التنظيمية للمشاريع
- التعرف على خصائص وميزات ومساوئ كل نوع من أنواع البنى التنظيمية للمشاريع
- التعرف على كيفية اختيار البنية التنظيمية المناسبة للمشروع

1. مقدمة
2. أنواع الهياكل التنظيمية للمشاريع
3. الهيكل التنظيمي الوظيفي
4. الهيكل التنظيمي المشاريع
5. البنية التنظيمية المصفوفية للمشاريع
6. اختيار الهيكل التنظيمي الصحيح

1. مقدمة

- الحاجات الرئيسية الثلاثة للهيكل التنظيمي للمؤسسة
- الثلاثة C

الاتصالات Communication ➤

تعاون Cooperation ➤

تنسيق Coordination ➤

- ماذا يعني ذلك؟ العمل سوياً

- العمل على مهام تتضمن أكثر من شخص - تواصل وتعاون
- تبادل الأساليب والأدوات المشتركة لتقييم وإبلاغ حالة المشروع
- تحديد المشكلات وحلها معاً - والتعايش مع النتائج معاً
- تقبل حقيقة أنه إذا أخطأ شخص ما، فإن الفريق بأكمله يعاني
- إدراك الفريق قد يتغير


تحديات تنظيم المشاريع

- تفرد المشاريع وقصر مدتها
✓ بالنسبة للأنشطة التنظيمية المستمرة طويلة الأجل
- طبيعة المشاريع متعددة التخصصات والوظائف
✓ هذا يخلق معضلات السلطة والمسؤولية
- اختيار هيكل إدارة المشروع المناسب
✓ أفضل نظام يوازن بين احتياجات المشروع واحتياجات المنظمة

2. أنواع الهياكل التنظيمية للمشاريع

- الهيكل التنظيمي الوظيفي
- الهيكل التنظيمي المشاريع
- الهيكل التنظيمي المصفوفي


Functional



Project



Matrix

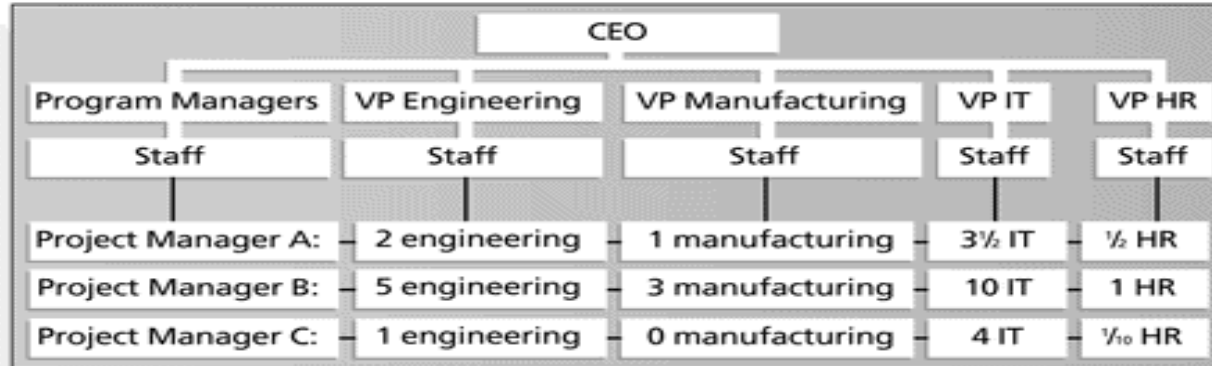

3. الهيكل التنظيمي الوظيفي

خصائص الهيكل التنظيمي الوظيفي

- بنية هرمية يجري تصنيف الأشخاص فيها في أقسام وظيفية كالتسويق أو الإنتاج أو المالية
- يكون لكل موظف رئيس مباشر واحد
- يكون نطاق المشروع مقتصرًا ضمن حدود قسم وظيفي واحد
- يوجد في كل قسم وظيفي عدد من مديري المشاريع التابعين له فقط
- تنظيم الأفراد في مجموعات تؤدي نفس الوظيفة أو لديهم نفس الخبرة أو المهارات
- يُستخدم في الشركات التي تنتج وتبيع المنتجات القياسية


3. الهيكل التنظيمي الوظيفي

خصائص الهيكل التنظيمي الوظيفي

- تشكيل فرقٍ للعمل في مشاريع الشركة الداخلية
- المشروع هو مسؤولية قسم واحد.
- مخصص للقسم الذي يتمتع بأكبر قدر من الاهتمام والقدرة الفنية
- يمكن إكمال جميع المهام تقريبًا داخل قسم واحد
- يستخدم عندما
- تهيمن مصلحة مجال وظيفي واحد على المشروع
- مجال وظيفي واحد له مصلحة مهيمنة في نجاح المشروع

3. الهيكل التنظيمي الوظيفي

خصائص الهيكل التنظيمي الوظيفي

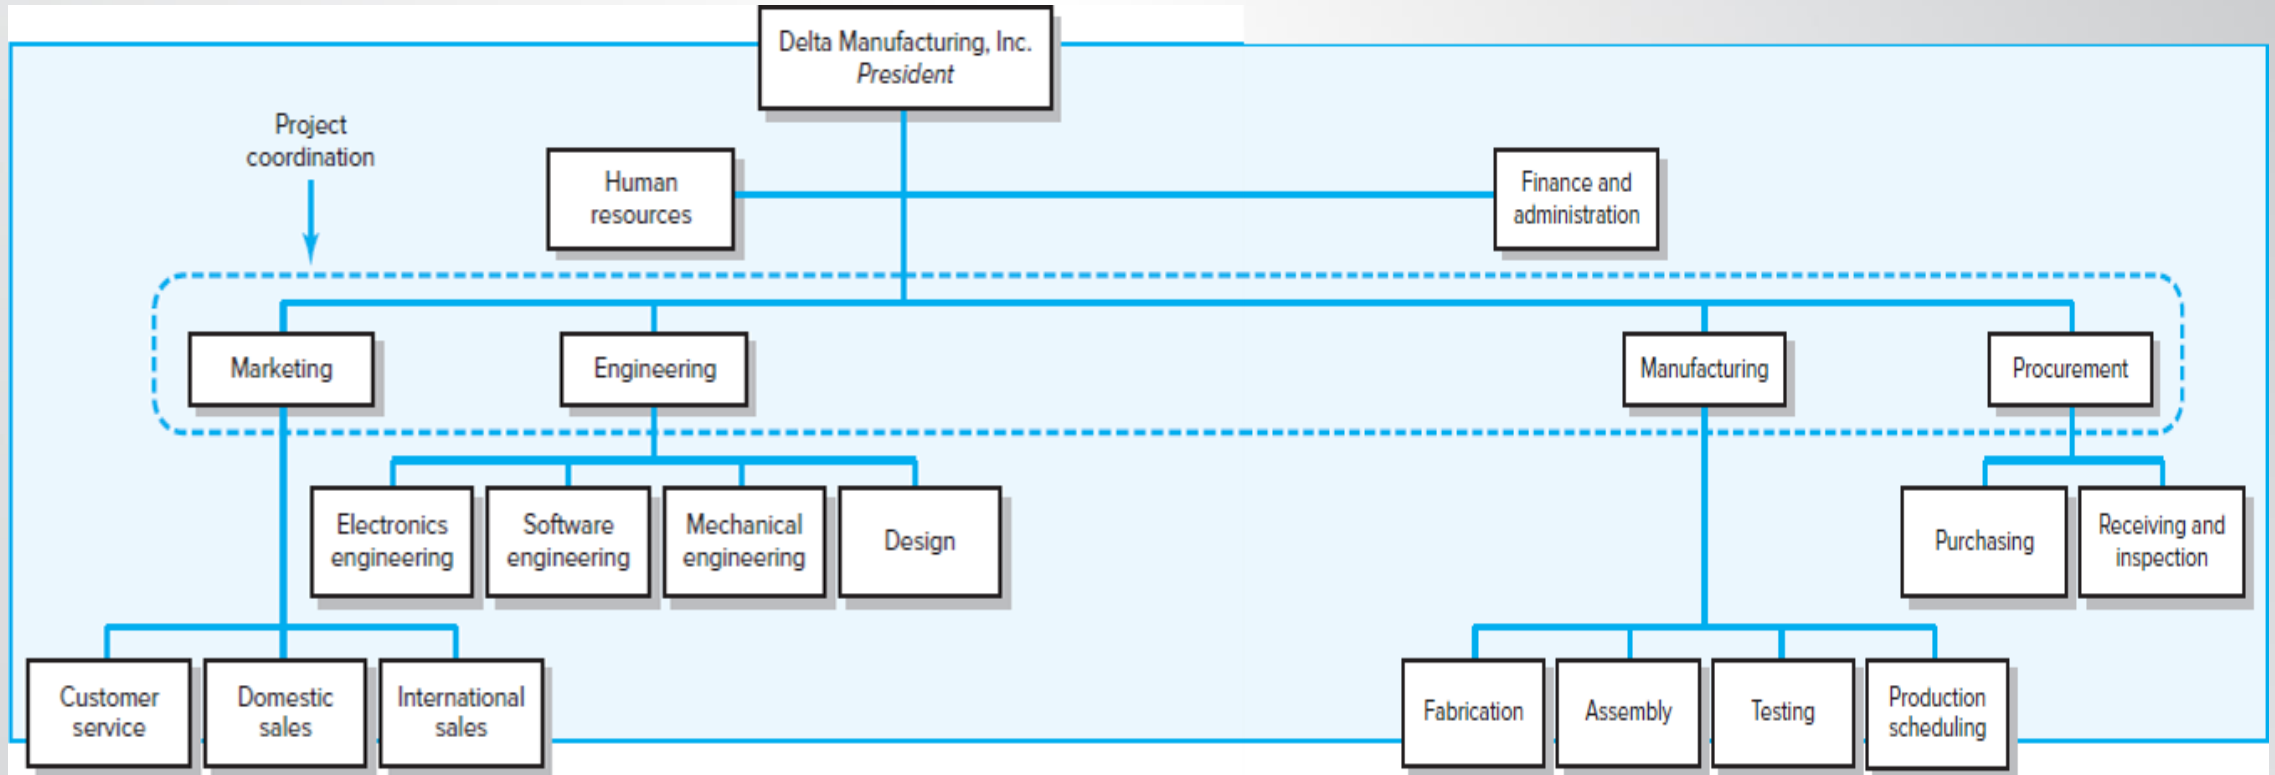

3. الهيكل التنظيمي الوظيفي

خصائص الهيكل التنظيمي الوظيفي

- يعمل مديرو المشاريع في القسم
 - يملكون مستوى من الخبرة في مجالات مسؤولياتهم
- يقوم مديرو الأقسام الوظيفية بإدارة الأشخاص الذين يعملون بالمشاريع وكذلك الأشخاص الذين يعملون في القسم
- يجري تكليف الأشخاص بالعمل في المشاريع التي تحتاج لمهاراتهم وخدماتهم
 - يمكن أن يتم نقلهم ضمن نفس القسم متى دعت الحاجة لذلك

3. الهيكل التنظيمي الوظيفي

مميزات الهيكل التنظيمي الوظيفي

- ألفة الفريق
- توافر الموظفين
- سلطة واضحة
- المرونة
- سهولة الانتقال بعد المشروع
- نظام إداري راسخ
- كفاءة الجدولة
- لا تغيير هيكل
- الخبرة المتعمقة

3. الهيكل التنظيمي الوظيفي

مساوئ الهيكل التنظيمي الوظيفي

- موارد محدودة
- عدم التركيز على المشروع
- التركيز على احتياجات القسم
- تكامل ضعيف
- نقص الملكية
- إجراءات البيروقراطية
- عدم وضوح الأدوار
- صعوبة محاسبة تكاليف المشروع
- بطيء


4. الهيكل التنظيمي المشاريع

خصائص الهيكل الوظيفي المشاريع

- تكون المشاريع موجودة ضمن وحدات تنظيمية مستقلة
- يكون لكل مشروع مدير متفرغ
 - ✓ يمتلك سلطة كاملة على المشروع وسلطة إدارية على فريق المشروع
- توجد وحدة مركزية تعنى باحتياجات المنظمة كلها من إدارة المشاريع
 - ✓ مكتب إدارة المشروع Project Management Office (PMO)
- يعمل كل مشروع ككيان مستقل مع تخصيص موارد خاصة به
- في المنظمات التي لا تنتج منتجات قياسية
 - ✓ تعمل في مجال المشاريع
 - ✓ تنفذ عدة مشاريع في وقت واحد
- يتم تعيين الأشخاص للعمل في مشروع معين
 - ✓ عند الانتهاء من المشروع قد يتم إعادة تكليفهم للعمل في مشروع آخر أو تسريحهم
- غير فعالة من حيث التكلفة سواء على مستوى المشاريع الفردية أو على مستوى الشركة ككل
 - ✓ عدم الاستفادة من أنشطة أو مخرجات المشاريع المتزامنة الأخرى

4. الهيكل التنظيمي المشاريع

خصائص الهيكل الوظيفي المشاريع

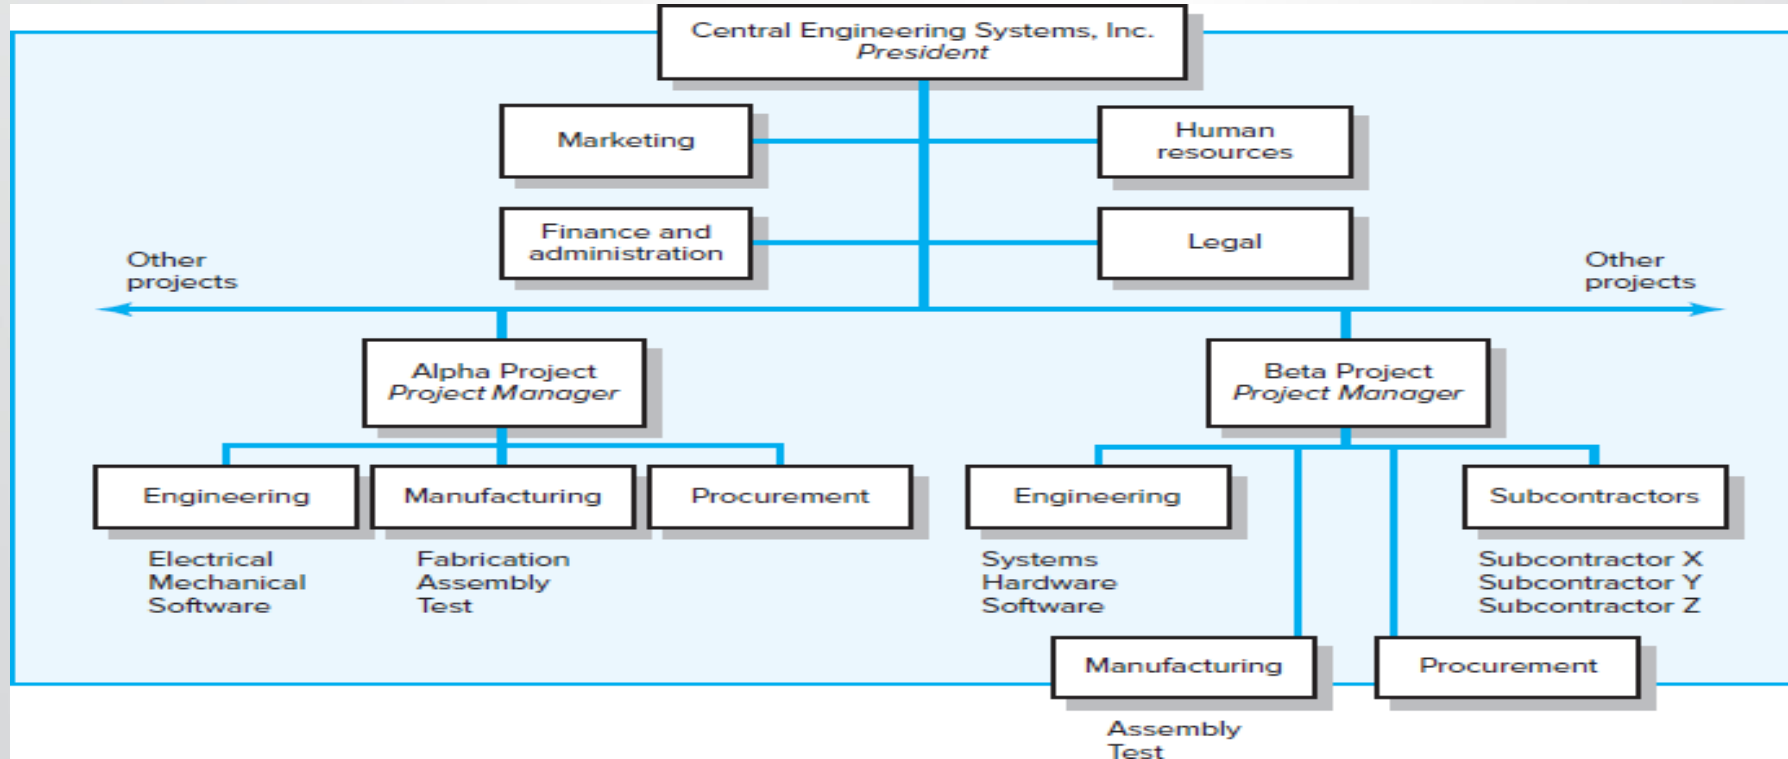

4. الهيكل التنظيمي المشاريع

مميزات الهيكل الوظيفي المشاريع

- يجري اعتماد نظام رسمي لإدارة المشاريع وتطبيقه في جميع أنحاء المنظمة
- توجد معايير مشتركة للتخطيط والمراقبة لجميع المشاريع.
- يبقى مديرو المشاريع المؤهلون تأهيلاً عالياً متاحين لصالح الجميع
- يمكن تخفيض التكاليف عن طريق استخدام أدوات مشتركة (مثل برمجيات إدارة المشاريع) لإدارة جميع المشاريع
- يمكن تحليل بيانات مركزية من جميع المشاريع وتطبيقها على المشاريع المستقبلية لتحسين دقة التقديرات والممارسات
- يمكن إدارة حقيبة من المشاريع بإدارة مشتركة للأولويات والموارد من قبل فريق مركزي

4. الهيكل التنظيمي المشاري

مميزات الهيكل الوظيفي المشاري

- سلطة واضحة للمشروع
- اتصالات المشروع المبسطة
- الوصول إلى الخبرات الخاصة
- تركيز المشروع والأولوية
- السرعة
- تماسك

4. الهيكل التنظيمي المشاريع

مساوئ الهيكل الوظيفي المشاريع

- يمكن أن تصبح المعايير والوثائق مفرطة وبدون دقة كبيرة،
- يمكن أن تُستخدم مركزية إدارة المشاريع والممارسات لخدمة مصالح ذاتية.
- ارتفاع التكلفة الإجمالية لإدارة المشاريع
- يمكن أن يكون القادة المؤهلون فنياً نادرين
- ازدواجية الجهود
- التنافس داخل الشركة
- تكلفة
- الخبرة التكنولوجية المحدودة
- ولاءات ودوافع غير واضحة
- إعادة دمج غير مؤكد للموارد
- صراع داخلي
- الانتقال الصعب بعد المشروع


5. البنية التنظيمية المصفوفية للمشاريع

خصائص الهيكل التنظيمي المصفوفي

- هيكل تنظيمي هجين بين بالهيكل الوظيفي والهيكل المشاريع
- سلسلتان من القيادة (الوظيفية والمشروعية)
- يقدم المشاركون في المشروع تقارير في وقت واحد إلى كل من مديري الوظائف والمشاريع
- يحسن من استخدام الموارد
- يسمح بالمشاركة في مشاريع متعددة أثناء أداء المهام الوظيفية العادية
- يحقق تكاملاً أكبر بين الخبرات ومتطلبات المشروع
- يحاول الاستفادة من مزايا الهيكل المشاريع مع الحفاظ على مزايا الهيكل الوظيفي
- يحتاج إلى مشاركة الموارد النادرة أو الفريدة المطلوبة في أكثر من مشروع أو مجال وظيفي
- متطلبات الإدارة لتوفير مستويات عالية من معالجة المعلومات والاتصال

5. البنية التنظيمية المصفوفية للمشاريع

خصائص الهيكل التنظيمي المصفوفي

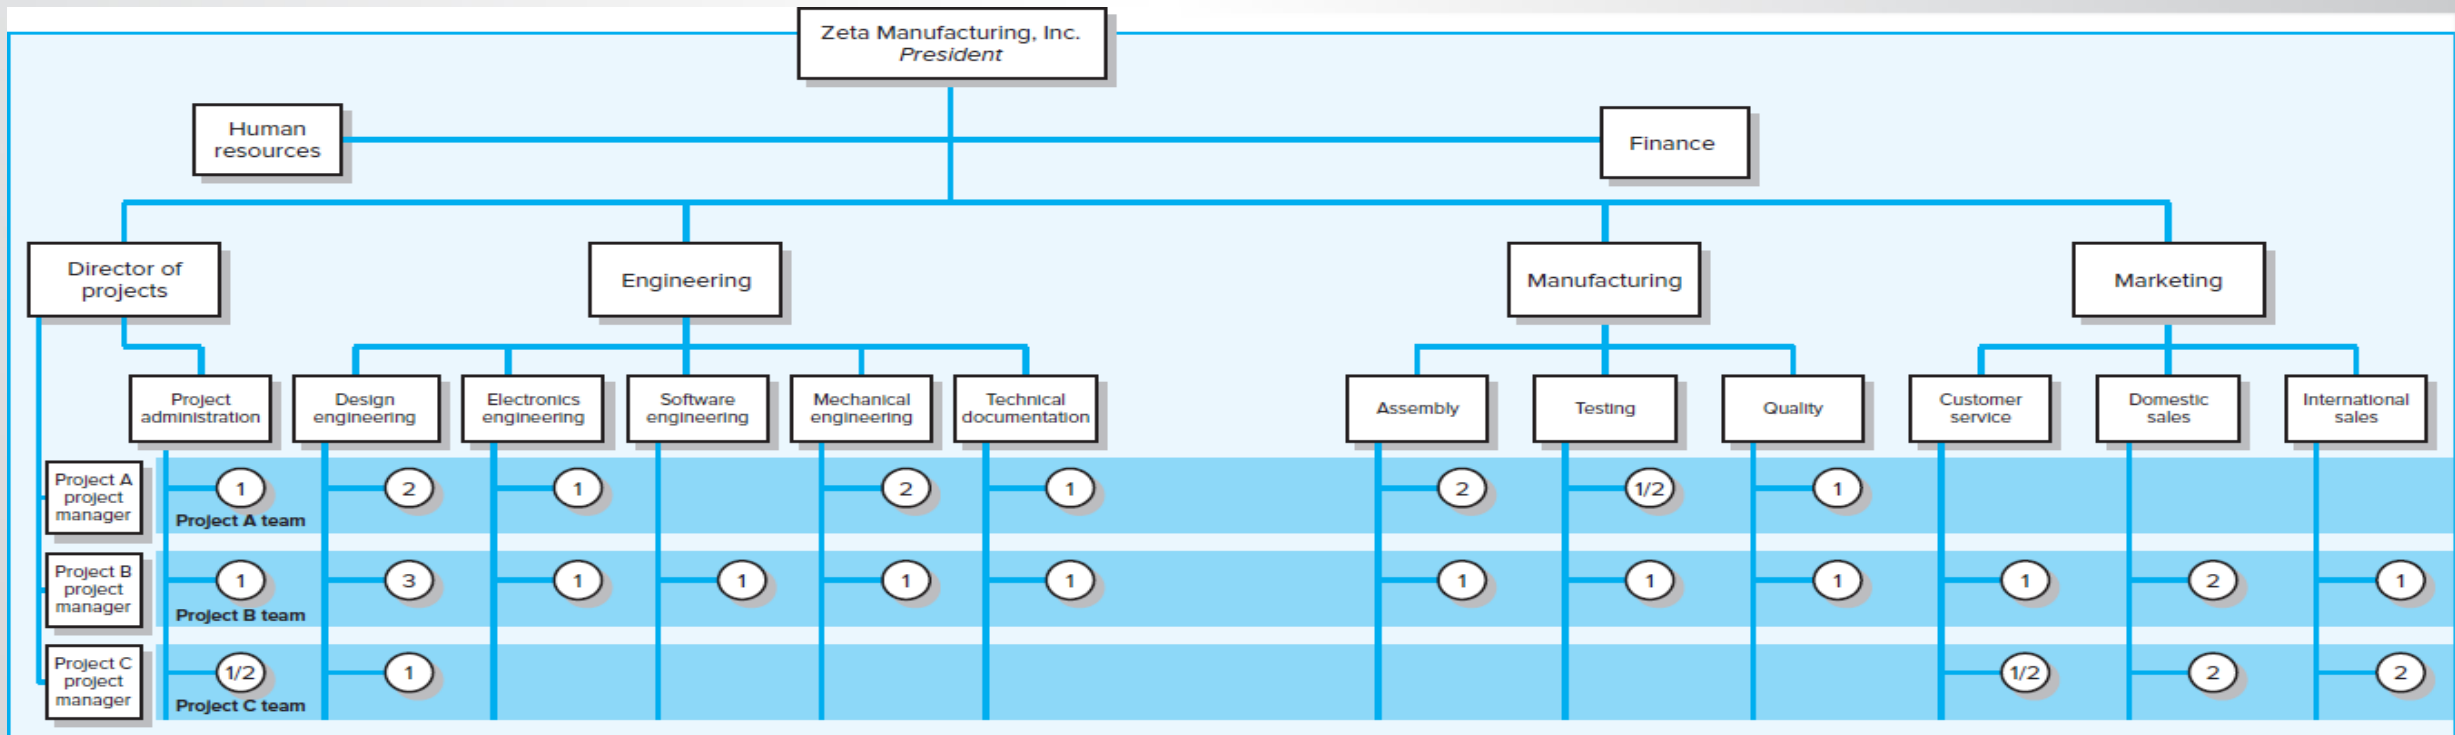

5. البنية التنظيمية المصفوفية للمشاريع

أشكال الهيكل التنظيمي المصفوفي

• هيكل مصفوفي ضعيف

- ✓ خصائصه قريبة من خصائص الهيكل التنظيم الوظيفي
- ✓ يكون دور مدير المشروع أكثر من منسق وتتنوع صلاحياته أكثر بقليل
- ✓ تسود فيه سلطة المدير الوظيفي ويكون لمدير المشروع سلطة غير مباشرة

• هيكل مصفوفي قوي

- ✓ يكون مدير المشروع مفرغاً كلياً للمشروع ويتمتع بسلطة وصلاحيات واسعة بخصوص المشروع وفريق العمل
- ✓ خصائصه قريبة من خصائص الهيكل التنظيم المشاريعي
- ✓ تعمل الأقسام الوظيفية كمقاولين من الباطن للمشروع

• هيكل مصفوفي متوسط

- ✓ يقع في المنتصف بين الهيكلين السابقين
- ✓ يحدد فيه مدير المشروع الخطة العامة ويحدد المدير الوظيفي كيفية إنجاز العمل

5. البنية التنظيمية المصفوفية للمشاريع

مميزات الهيكل التنظيمي المصفوفي

- للتنظيم المصفوفي مزايا كل من التنظيم الوظيفي والتنظيم المشاريعي
- لا يكون الأشخاص والمهارات مكررين
- عندما تندر الخبرات فمن الممكن تطبيقها بمرونة وكفاءة في مشاريع مختلفة
- استيعاب التغيرات في الاحتياجات من العاملين بسهولة
- حل الصراعات بين احتياجات المشاريع واحتياجات الاقسام الوظيفية بسهولة
- خبرة إدارة المشروع والإدارة الوظيفية متاحة للمساعدة في المشروع
- يسمح هذه الهيكل بإنجاز المشروع في وقت أقصر وبكلفة أقل.
- تركيز واضح على المشروع
- القدرة على التكيف مع احتياجات الإدارة والمهارات
- القدرة على التكيف مع التغيرات الإدارية
- فعال
- التوظيف المرن
- فرص تطوير الموظفين
- انتقال أسهل بعد المشروع

5. البنية التنظيمية المصفوفية للمشاريع

مساوئ الهيكل التنظيمي المصفوفي

- صعوبة التواصل
- صراعات وتنافسات بين مدير المشروع والمدير الوظيفي
- مقاومة الإنهاء
- علاقات القيادة والسلطة المعقدة
- أنظمة التعرف على الموظفين المعقدة
- الاقتتال الداخلي
- ❖ في عملية تسوية تضارب الأولويات يمكن أن يصاب العاملون بالمشروع بالإحباط.
- مجهد
- بطيء

6. اختيار الهيكل التنظيمي الصحيح

سلطة مدير المشروع

<i>Organizational structure</i>	<i>Project manager authority</i>	<i>Percent of personnel assigned full-time to project work</i>	<i>Project manager's role</i>	<i>Common titles for project manager</i>	<i>Project management staff</i>
Functional	Little or none	None	Part-time	Project Facilitator or Coordinator	Part-time
Weak matrix	Limited	0–25%	Part-time	Project Coordinator or Leader	Part-time
Balanced matrix	Low	15–60%	Part-time or full-time	Project Coordinator or Manager	Part-time
Strong matrix	Moderate	50–95%	Full-time	Project or Program Manager	Full-time
Project	High to almost total	85–100%	Full-time	Project or Program Manager	Full-time

6. اختيار الهيكل التنظيمي الصحيح

• اعتبارات المنظمة

1. ما هي أهمية المشروع لنجاح المنظمة؟
2. ما هي النسبة المئوية من أعمال المنظمة المتعلقة بالمشاريع؟
3. ما هو مستوى الموارد (البشرية والمادية) المتاحة؟

• اعتبارات المشروع

1. حجم المشروع
2. الأهمية الاستراتيجية
3. الحداثة والحاجة إلى الابتكار
4. الحاجة إلى التكامل (عدد الأقسام المشاركة)
5. التعقيد البيئي (عدد الواجهات الخارجية)
6. قيود الموازنة والوقت
7. استقرار متطلبات الموارد



إدارة المشاريع

Project Management

نهاية المحاضرة الحادية عشرة: البنية التنظيمية للمشاريع

PROJECT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

الدكتور إياد زوكار
