

## إدارة المشاريع

## Project Management

### المحاضرة الثالثة عشرة: إدارة فريق المشروع

## Project Team Management

الدكتور إياد زوكار


- التعرف على أهمية فريق العمل لنجاح المشروع
- التعرف على نموذج المراحل الخمسة التي يمر بها فريق المشروع، وميزات كل مرحلة وما الذي يجب الانتباه له أثناء كل مرحلة
- التعرف على العوامل الظرفية التي تؤثر على تطور فريق المشروع
- التعرف على كيفية بناء فريق عمل عالي الأداء
- فهم آلية اختيار فريق العمل وإنشاء هويته وتطوير رؤية مشتركة له
- التعرف على كيفية إدارة اجتماعات الفريق بفعالية
- التعرف على آلية اتخاذ القرار ضمن المشروع وكيفية حل الخلافات
- التعرف على كيفية وضع نظام للحوافز والمكافآت وتجديد فريق العمل

1. مقدمة
2. نموذج المراحل الخمسة لتطوير الفريق
3. العوامل الظرفية التي تؤثر على تطور الفريق
4. بناء فريق مشروع عالي الأداء

## خصائص فريق العمل عالي الأداء

- يشارك الفريق الشعور بالهدف المشترك
- يكشف الفريق المواهب والخبرات الفردية ويستخدمها
- تتم موازنة الأدوار ومشاركتها لتسهيل إنجاز المهام ومشاعر تماسك الفريق
- يبذل الفريق الطاقة لحل المشاكل بدلاً من إضاعتها في القضايا الشخصية أو الصراعات التنافسية
- يتم تشجيع الاختلافات في الرأي والتعبير
- تشجيع المخاطرة والإبداع
- تبني معايير شخصية عالية للأداء
- اندماج الأعضاء ضمن الفريق واعتباره مصدراً هاماً للتطور المهني والشخصي

## 2. نموذج المراحل الخمسة لتطوير الفريق

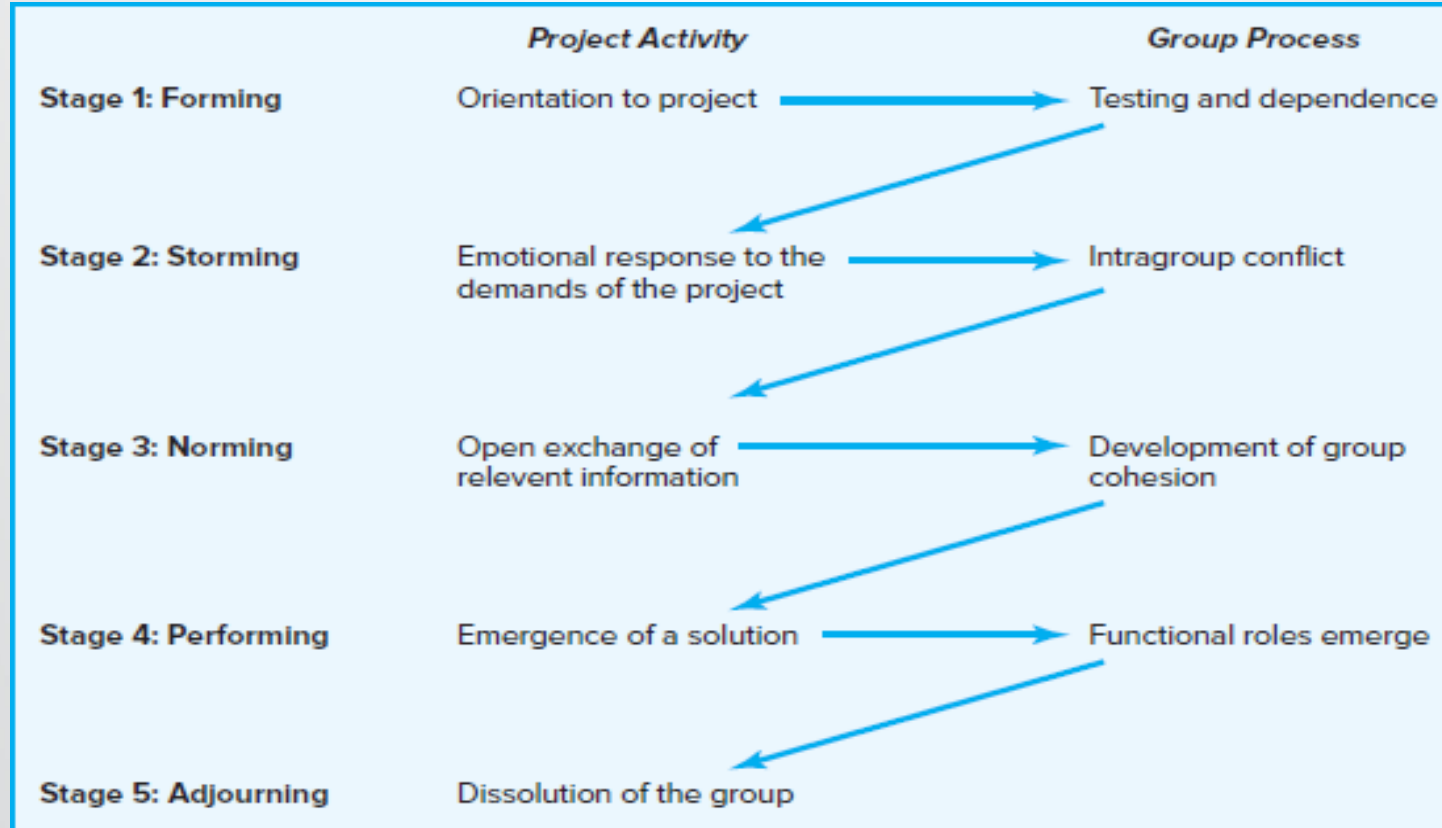

- المرحلة الأولى: التشكيل
- المرحلة الثانية: الاقتحام
- المرحلة الثالثة: التطبيع
- المرحلة الرابعة: الأداء
- المرحلة الخامسة: الانقضاء

## 2. نموذج المراحل الخمسة لتطوير الفريق

### المرحلة الأولى: التشكيل

- يتعرف الأعضاء على بعضهم البعض
- يفهمون نطاق المشروع
- يبدأون في وضع قواعد العمل
  - ✓ السلوكيات المقبولة فيما يتعلق بكل من المشروع (ما الدور الذي سوف سيقومون به، ما هي توقعات الأداء؟)
  - ✓ العلاقات بين الأشخاص (من سيقوم بماذا؟)
- يبدأ الأعضاء بالتفكير في أنفسهم كجزء من مجموعة

### المرحلة الثانية: الاقتحام

- درجة عالية من الصراع الداخلي
- يقبل الأعضاء أنهم جزء من مجموعة المشروع
- يقاومون القيود التي يفرضها المشروع والفريق عليهم كأفراد
- صراع حول من سيطر على المجموعة وكيف سيتم اتخاذ القرارات
- حلّ هذه الصراعات حتى تصبح قيادة مدير المشروع مقبولة

## 2. نموذج المراحل الخمسة لتطوير الفريق

### المرحلة الثالثة: التطبيع

- تتوثق العلاقات بين الأعضاء وتصبح المجموعة متماسكة
- تزداد مشاعر المودة والمسؤولية المشتركة للمشروع
- وضع التوقعات المشتركة حول كيفية العمل معاً

### المرحلة الرابعة: الأداء

- تعمل البنية التشغيلية للفريق في هذه المرحلة بشكل كامل ومقبول
- تنتقل جهود وطاقة الأفراد من التعرف على بعضهم البعض إلى كيفية القيام بالعمل معاً لتحقيق أهداف المشروع



## 2. نموذج المراحل الخمسة لتطوير الفريق

### المرحلة الثالثة: التطبيع

- تتوثق العلاقات بين الأعضاء وتصبح المجموعة متماسكة
- تزداد مشاعر المودة والمسؤولية المشتركة للمشروع
- وضع التوقعات المشتركة حول كيفية العمل معاً

### المرحلة الرابعة: الأداء

- تعمل البنية التشغيلية للفريق في هذه المرحلة بشكل كامل ومقبول
- تنتقل جهود وطاقة الأفراد من التعرف على بعضهم البعض إلى كيفية القيام بالعمل معاً لتحقيق أهداف المشروع

### المرحلة الخامسة: الانقضاء

- يستعد الفريق لإنهاء أعماله وتسريح أعضائه
- لم يعد للأداء العالي الأولوية القصوى
- يتم الاهتمام بالأعمال الختامية للمشروع
- تختلف ردود الأعضاء

- البعض يكونون متفائلين وفرحين بفضل إنجازات فريق المشروع
- البعض الآخر يكونون مكتئبين بسبب فقدان الصداقات المكتسبة أثناء حياة المشروع



### 3. العوامل الظرفية التي تؤثر على تطور الفريق

#### • تتطور فرق المشاريع عالية الأداء بشكل أفضل إذا تحققت الشروط التالية


- ☐ هناك 10 أفراد أو أقل لكل فريق
- ☐ يتطوع الأعضاء للعمل في فريق المشروع
- ☐ يعمل الأعضاء في المشروع من بدايته وحتى نهايته
- ☐ يتم تعيين الأعضاء بدوام كامل في المشروع
- ☐ يكون الأعضاء جزءاً من ثقافة المنظمة التي تعزز التعاون والثقة
- ☐ يرفع الأعضاء تقاريرهم فقط لمدير المشروع
- ☐ يتم تمثيل كافة المجالات والأقسام الوظيفية ذات الصلة في فريق المشروع
- ☐ للمشروع هدف مقنع
- ☐ يقع الأعضاء على نفس مسافة التخاطب من بعضهم البعض

### 3. العوامل الظرفية التي تؤثر على تطور الفريق

- في الواقع العملي، من النادر أن يستطيع مدير المشروع تشكيل فريق تجتمع فيه جميع هذه الظروف
  - مشاركة أكثر من 10 أعضاء
  - يقوم المديرون الموظفون أو إدارة الموارد البشرية بتعيين أعضاء المشروع بمشاوره محدوده مع مدير المشروع
  - تعيين عدد من أعضاء الفريق بدوام جزئي
  - يقدم أعضاء الفريق تقاريرهم لعدد من المدراء المختلفين
  - لا يكون لمدير المشروع تأثير مباشر على تقييم أداء أعضاء الفريق
  - لا تكون جميع المجالات الوظيفية الرئيسة ممثلة أثناء كامل مدة المشروع
  - يمكن ألا يكون هدف المشروع مقنعاً للجميع
  - من الصعب الحصول على أعضاء متحمسين للمشاريع العادية
  - ينتشر أعضاء الفريق عبر مكاتب ومباني المنظمة ولا يعملون بمكان واحد
- التعرف على المعوقات الظرفية التي يعملون تحتها والقيام بأفضل ما يمكن

## 4. بناء فريق مشروع عالي الأداء

- اختيار وتعيين فريق العمل
- قيادة اجتماعات المشروع
- إنشاء هوية الفريق
- إنشاء رؤية مشتركة
- إدارة نظام المكافآت في مشروع
- قيادة عملية صنع القرار
- إدارة الخلافات والصراعات ضمن مشروع
- تجديد فريق المشروع

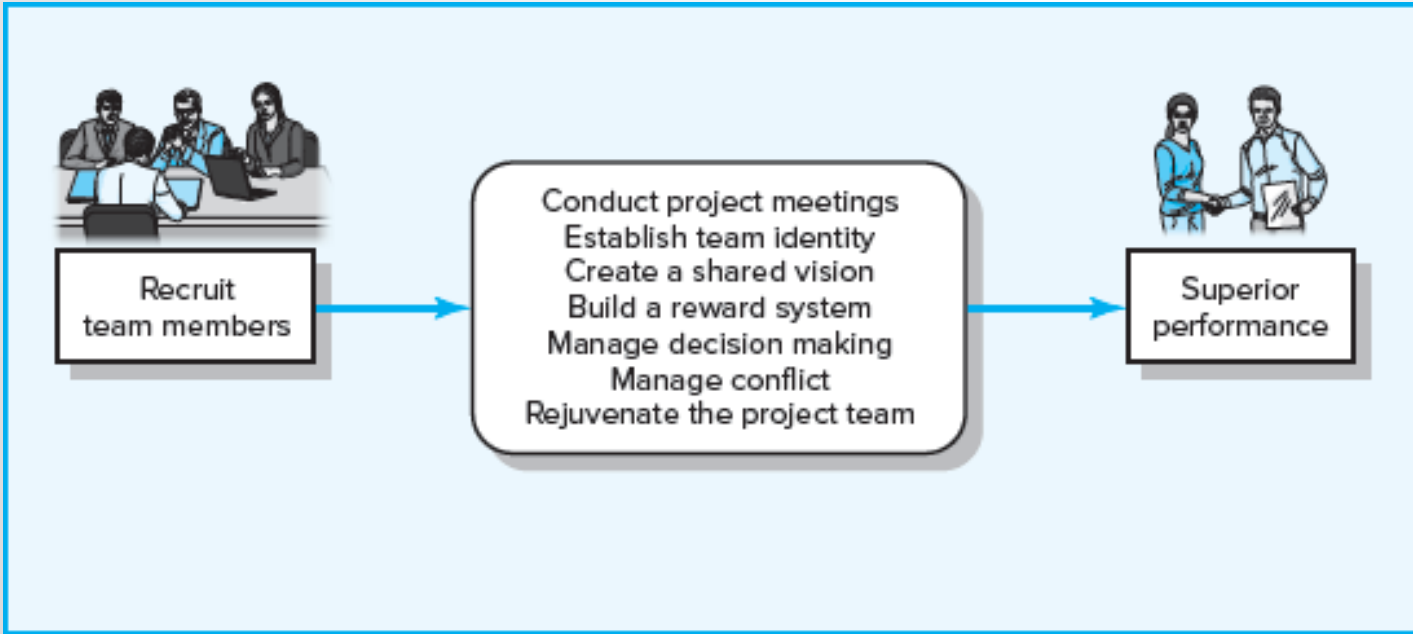

## 4. بناء فريق مشروع عالي الأداء

### اختيار وتعيين فريق العمل

#### • أهمية المشروع

- المشاريع المهمة: يُعطى مدير المشروع تفويضاً مطلقاً لاختيار من يراه ضرورياً
- المشاريع العادية: على مدير المشروع إقناع العاملين في مناطق أخرى داخل المنظمة للانضمام للفريق

#### • الهيكل الإداري المستخدم لإنجاز المشروع

- الهيكلية المصفوفية، يكون المدير الوظيفي هو المسؤول عن تعيين أعضاء فريق المشروع

#### • أهمية طلب متطوعين للانضمام لفريق العمل

- الموافقة على العمل في المشروع هو الخطوة الأولى نحو بناء الالتزام الشخصي فيه

- البحث عن الأفراد ذوي الخبرة اللازمة والمعرفة والمهارات الفنية الضرورية
- اعتبارات أخرى في عملية الاختيار
  - القدرة على حل المشاكل
  - أن يكون الفرد متاحاً
  - الخبرة التكنولوجية
  - المصداقية
  - الاتصالات السياسية
  - الطموح والمبادرة والطاقة
- المناقشة والتفاوض مع المدير الوظيفي

## 4. بناء فريق مشروع عالي الأداء

### قيادة اجتماعات المشروع

#### • الاجتماع الأول لفريق المشروع

□ تقديم لمحة عامة عن المشروع

✓ نطاقه وأهدافه والجدول الزمني والطريقة والإجراءات التي سيتم اتباعها في العمل

□ البدء في معالجة بعض المخاوف الشخصية

✓ من هم أعضاء الفريق الآخرين؟

✓ كيف ساندماج معهم؟

✓ هل سأكون قادراً على العمل مع هؤلاء الأشخاص؟

□ البدء بنمذجة كيفية قيام الفريق بالعمل معاً لإنجاز المشروع

□ الانطباعات الأولى مهمة

□ الاجتماع خارج موقع العمل

□ أهداف الاجتماع واقعية نظراً للوقت المتاح

## 4. بناء فريق مشروع عالي الأداء

### قيادة اجتماعات المشروع

#### • وضع القواعد الأساسية

- القواعد الأساسية التشغيلية لكيفية عمل الفريق معاً.
- المسائل التنظيمية والإجرائية فقط
- القضايا المعيارية حول كيفية التفاعل بين أعضاء الفريق
- قرارات التخطيط
- قرارات المتابعة
- قرارات إدارة التغيير
- قرارات العلاقات

#### • إدارة الاجتماعات اللاحقة للمشروع

- اجتماعات تقارير الأداء
- اجتماعات حلّ المشكلات
- اجتماعات المراجعة والتدقيق



## 4. بناء فريق مشروع عالي الأداء


### إنشاء هوية الفريق

- مشكلة عدم تفرغ أعضاء الفريق بشكل كامل للعمل في المشروع
- ينتمي العاملون غالباً لفرق مشاريع متعددة
  - ❖ تتنافس على وقتهم والولاء لها
  - ❖ يؤثر هذا على دافعهم وحافزهم للعمل
- جعل فريق المشروع متماسكاً من خلال تطوير هوية الفريق الفريدة
  - ❖ الاستخدام الفعال للاجتماعات
  - ❖ تخصيص موقع واحد للفريق
  - ❖ إطلاق اسم على الفريق
  - ❖ دفع الفريق للقيام بشيء ما معاً في وقت مبكر
  - ❖ تطوير طقوس الفريق

## 4. بناء فريق مشروع عالي الأداء

### إنشاء رؤية مشتركة

### صفات الرؤية الفعالة

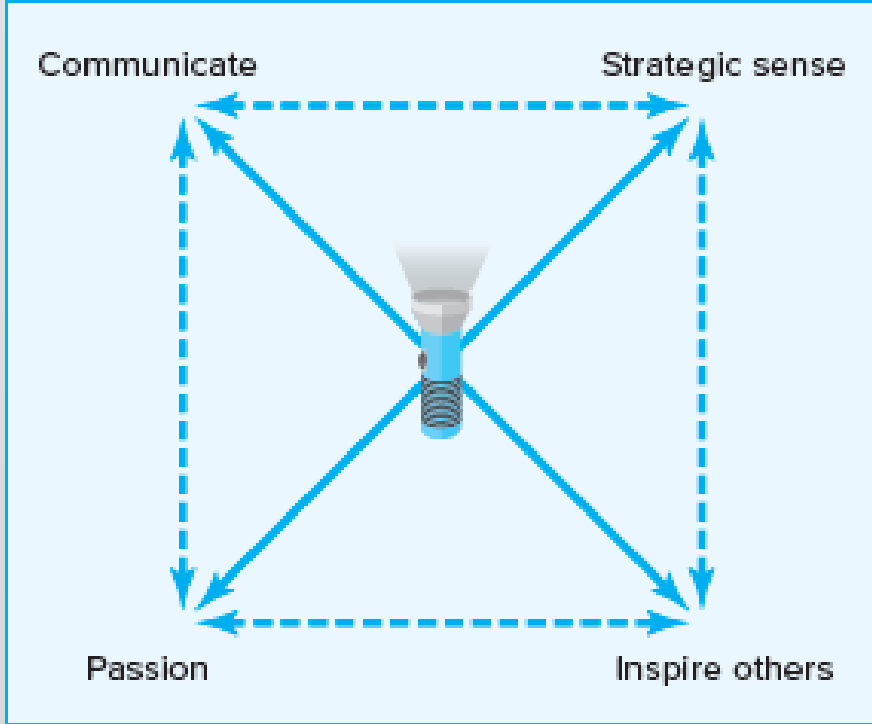

• صورة مشتركة لفريق المشروع حول الشكل النهائي للمشروع

➤ كيف سيعملون معاً

➤ كيف سيتقبل الزبائن المشروع

➤ "ماذا نريد أن ننشئ؟"

• شعارٍ أو رمزٍ أو يمكن كتابتها كبيان رسمي

• تلهم أعضاء الفريق وتوحدهم لتقديم أفضل ما عندهم من أجل الوصول إلى تحقيق هدف المشروع

• تساعد في تحفيز أعضاء الفريق

• التركيز والتواصل حول الأولويات

## 4. بناء فريق مشروع عالي الأداء

### إدارة نظام المكافآت في مشروع

- هناك مشاريع توفر للمشاركين فيها تغييراً وفرصة لتعلم مهارات جديدة وللخروج من قوقعة العمل الوظيفي
- هناك مشاريع غير المناسبة أو المملة وتُعتبر عبئاً
  - المكافأة هي الانتهاء من المشروع
  - تلعب المكافآت الخارجية دوراً أكثر أهمية في تحفيز أداء الفريق
- المكافآت والحوافز مرتبطة بأولويات المشروع
- مكافآت جماعية لكامل فريق العمل
- مكافأة الأداء الفردي
  - خطابات الثناء
  - الاعتراف بالأعمال المتميزة بشكل علني
  - تكاليفات العمل المرغوبة
  - المرونة

## 4. بناء فريق مشروع عالي الأداء


### قيادة عملية صنع القرار

- اتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي
- الإدارة بالتجوال
- المشاكل المعقدة تتطلب اتخاذ القرارات الجماعية
- تحدّد المشاركة في اتخاذ القرار من المقاومة وتأمّن الدعم لهذا القرار
- تسهيل صنع القرار الجماعي
  - تحديد المشكلة
  - توليد البدائل
  - التوصل إلى قرار
  - المتابعة

## 4. بناء فريق مشروع عالي الأداء

### إدارة الخلافات والصراعات ضمن مشروع

- يختلف المشاركون على الأولويات أو على تخصيص الموارد أو على جودة العمل أو على حلول المشاكل
- تدعم بعض الصراعات أهداف المشروع وأن تحسن من أداء الفريق
- مصادر الصراع أثناء تقدم العمل في المشروع
  - الجدول الزمني، الأولويات، القوى العاملة، النواحي الفنية، الإجراءات، الكلفة، بين الأفراد

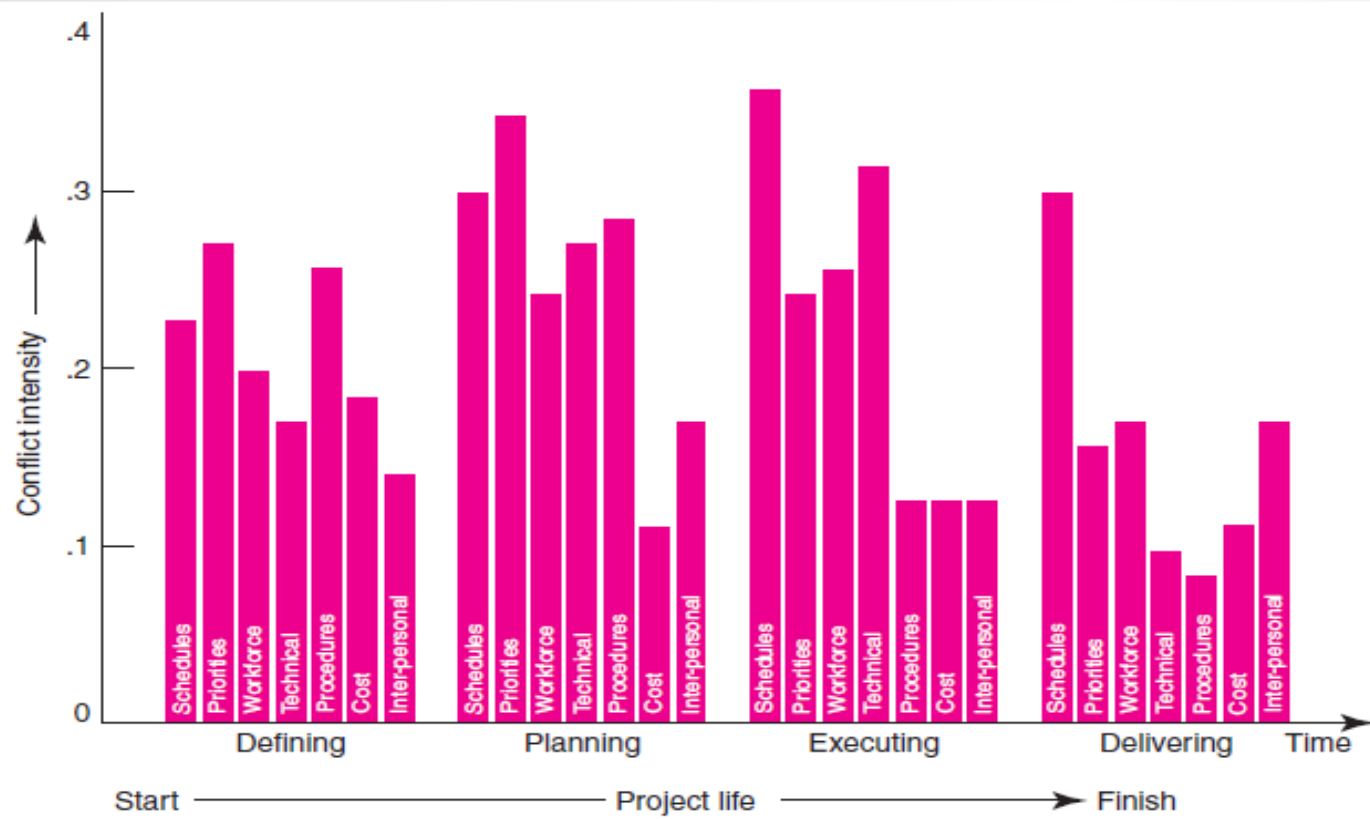

## 4. بناء فريق مشروع عالي الأداء

### تجديد فريق المشروع

- قد ينحرف الفريق أحياناً عن مساره ويفقد الزخم
- عادة تنظيم الفريق ليتماشى مع أهداف المشروع
- إنشاء طقوس لإعادة تنشيط الفريق كدعوته لقضاء يوم عطلة معاً للغداء ولممارسة رياضة معينة
- جلسات لتطوير الفريق مكرسة لتحسين إجراءات العمل في الفريق
  - مراجعة الفريق لذاته فيما يخص الأداء والسلوك والثقافة
  - التعاقد مع مستشار خارجي



1. نموذج المراحل الخمسة لتطوير الفريق

2. العوامل الظرفية التي تؤثر على تطور الفريق

إدارة فريق المشروع

3. بناء فريق مشروع عالي الأداء

## إدارة المشاريع

## Project Management

نهاية المحاضرة الثالثة عشرة: إدارة فريق المشروع

## Project Team Management

الدكتور إياد زوكار
