

إدارة المشاريع

Project Management

المحاضرة الرابعة عشرة: إنهاء وإغلاق المشروع


Project Closure

الدكتور إياد زوكار

- التنبه إلى أهمية إنهاء المشروع بشكل منهجي
- التعرف على أنشطة إنهاء وإغلاق المشروع
- التعرف على آلية تقييم المشروع وفريق العمل
- التعرف على كيفية استخلاص الدروس والعبر من تجربة المشروع
- التمييز بين مختلف أنماط إغلاق المشروع
- التعرف على كيفية تسليم المنتجات للزبون وكتابة التقرير النهائي للمشروع وتحديث الموارد

1. مقدمة
2. أنشطة إنهاء المشروع
3. أنماط إغلاق المشروع
4. أنشطة إغلاق المشروع
5. تقييم المشروع
6. الدروس والعبر المستخلصة

الناتج الرئيسية لإغلاق المشروع

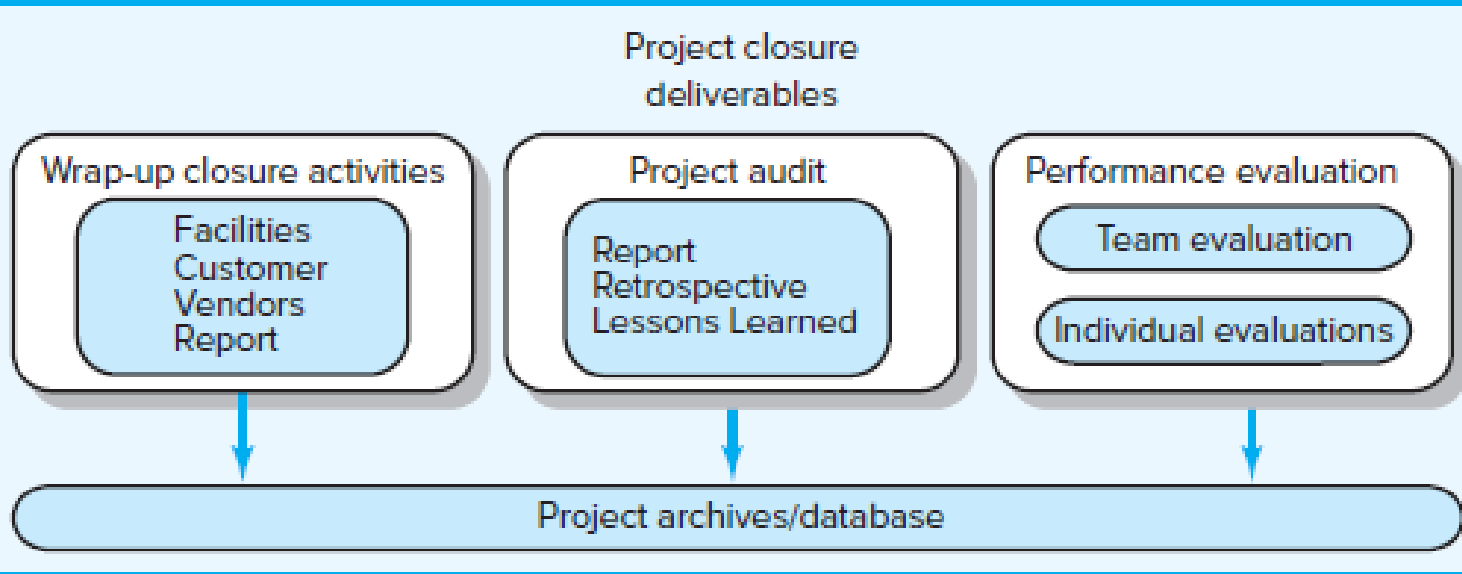

✓ في المشاريع الصغيرة

- مدير المشروع هو المسؤول عن رؤية جميع المهام والخيوط المفتوحة تصل إلى نهاياتها

✓ في المشاريع الكبيرة

✓ توزيع مسؤوليات إنهاء المشاريع بين

- مدير المشروع
- فرق المشروع
- مكتب إدارة المشروع
- لجنة المراجعة
- جهة مستقلة (مسهّل) لعمليات إدارة المعرفة والتغذية الراجعة

✓ تتداخل العديد من مهام عملية الإنهاء والإغلاق أو تحدث في وقت واحد

2. أنشطة إنهاء المشروع

ختام المشروع

تقييم الأداء
 وإدارة المشروع

الدروس المستفادة

2. أنشطة إنهاء المشروع

ختام المشروع

- ضمان الموافقة على المشروع وقبوله من قبل الزبون
- الحسابات الختامية
- دفع الفواتير
- إعادة تعيين الأفراد والمعدات
- إيجاد فرص جديدة للعاملين في المشروع
- إغلاق المرافق
- كتابة التقرير النهائي
- قوائم التحقق Checklists لضمان عدم نسيان أية مهمة

ختام المشروع

2. أنشطة إنهاء المشروع

تقييم الأداء وإدارة المشروع

- تقييم الفريق ككل
- تقييم أعضاء الفريق فراداً
- تقييم مدير المشروع
- يوفر الزبائن بعض المدخلات الخارجية لعملية التقييم

تقييم الأداء
وإدارة المشروع

2. أنشطة إنهاء المشروع

الدروس المستفادة

- تُستخدم الدروس المستفادة والعبر المستخلصة لتحسين أداء المشاريع الحالية والمستقبلية
- اللجوء إلى طرف خارجي مستقل (مسهّل) لهذه المهمة
- إعداد التقرير النهائي الذي يتضمن الدروس المستفادة
- إجراء مراجعات ما بعد انتهاء المشروع مع فريق العمل لإدراك الثغرات والقضايا المعلقة

الدروس المستفادة

3. أنماط إغلاق المشروع

الإغلاق العادي

الإغلاق المبكر

الإغلاق الأبدي

فشل المشروع

تغير الأولويات

3. أنماط إغلاق المشروع

الإغلاق العادي

- لإغلاق المشروع هو مجرد إنجاز واكتمال المشروع
- تسليم التصميم النهائي للإنتاج وإنشاء خط لمنتج جديد أو لخدمة جديدة
- دمج الناتج النهائي مع العمليات الجارية

الإغلاق المبكر

- الانتهاء من المشروع في وقت مبكر
- ✓ بسبب التخلي عن بعض أجزاء مشروع (تقليص النطاق)
- مراجعة الآثار والمخاطر المترتبة على هذا القرار بعناية وتقييمها

الإغلاق العادي

الإغلاق المبكر

3. أنماط إغلاق المشروع

الإغلاق الأبدي

- بعض مشاريع لا تنتهي أبداً بسبب الإضافات المستمرة
✓ يشير هذا إلى نطاق المشروع سيء التصميم
- في مرحلة ما يوصي فريق المراجعة بوضع طريقة أو آلية
✓ لإنهاء المشروع واعتبار ما تبقى مشروعاً جديداً

فشل المشروع

- تكون المشاريع الفاشلة عادةً سهلة التحديد ومن السهل على فريق المراجعة إغلاقها
- إيضاح الأسباب الفنية وغير الإدارية لإنهاء المشروع
- قد تفشل العديد من المشاريع بسبب ظروف خارجة عن سيطرة فريق المشروع

الإغلاق الأبدي

فشل المشروع

3. أنماط إغلاق المشروع

تغير الأولويات

تغير الأولويات

- تقوم إدارة المنظمة بمراجعة أولويات اختيار المشاريع باستمرار
✓ لتعكس التغيرات في الاتجاه التنظيمي
- يؤدي في بعض الأحيان لتغيير في نطاق المشاريع الجارية أو إلغاء بعضها

4. أنشطة إغلاق المشروع

- تجميع الخيوط وإنهاء الأعمال وإغلاق المشروع هي غالباً أعمال فيها بعض الصعوبة
- الحفاظ على فريق المشروع مركزاً على أنشطة المشروع المتبقية وتسليمها للزبون حتى اكتمال المشروع
- التواصل باكراً حول خطة الإغلاق والمراجعة والجدول الزمني
- الحفاظ على حماس فريق العمل لإنجاز المشروع والتقيّد بالمواعيد
- الأنشطة الختامية ما يلي:
 - الحصول على قبول التسليم من قبل الزبون
 - إغلاق الموارد وتحرير ما تبقى منها لاستخدامات جديدة
 - إعادة تكليف أعضاء فريق المشروع بأعمال جديدة
 - دفع الفواتير وإغلاق الحسابات
 - تسليم المشروع للزبون
 - إعداد التقرير النهائي

4. أنشطة إغلاق المشروع

• استخدام قوائم التحقق

	Task	Completed? Yes/No
	Team	
1	Has a schedule for reducing project staff been developed and accepted?	
2	Has staff been released or notified of new assignments?	
3	Have performance reviews for team members been conducted?	
4	Has staff been offered outplacement services and career counseling activities?	
	Vendors/Contractors	
5	Have performance reviews for all vendors been conducted?	
6	Have project accounts been finalized and all billing closed?	
	Customer/Users	
7	Has the customer signed off on the delivered product?	
8	Have an in-depth project review and evaluation interview with the customer been conducted?	
9	Have the users been interviewed to assess their satisfaction with the deliverables? With the project team? With vendors? With training? With support? With maintenance?	
	Equipment and Facilities	
10	Have project resources been transferred to other projects?	
11	Have rental or lease equipment agreements been closed out?	
12	Has the date for the closure review been set and stakeholders notified?	
	Attach comments or links on any tasks you feel need explanation.	

4. أنشطة إغلاق المشروع

الحصول على قبول التسليم من قبل الزبون

• يجب ألا تكون هناك مفاجآت

□ نطاقاً معرّفاً بشكل جيد

□ نظاماً فعالاً لإدارة التغيير

□ مشاركة نشيطة من الزبون مع ضرورة إشراك المستخدمين النهائيين

• وضع شروط استكمال ونقل المشروع قبل البدء في المشروع

• BOOT: (Build, Own, Operate, Transfer)

□ يقوم المتعاقد أو المقاول ببناء المنتج وتملكه وتشغيله لفترة معينة من الزمن قبل نقله إلى الزبون

□ خلال هذا الفترة يتم حلّ مشاكل التشغيل ووضع شروط التسليم للزبون

4. أنشطة إغلاق المشروع

إغلاق وتحرير الموارد

- يتم تحرير فريق المشروع تدريجياً خلال مرحلة الإغلاق
- تنتهي الأنشطة المسؤول عنها بعض أعضاء الفريق قبل أن يتم تسليم المشروع للزبون
 - يتم إنهاء عملهم بالمشروع وإعادة تكليفهم بأعمال أو مشاريع جديدة أو العودة إلى عملهم الوظيفي حتى قبل أن ينتهي المشروع
- قد يشارك بعض أعضاء الفريق بعمليات تشغيل منتج المشروع بعد انتهاء المشروع وتسليمه للزبون
 - في هذه الحالة سيحصلون على وظيفة تشغيلية لدى الزبون
- بالنسبة للأشخاص المتعاقد معهم
 - يتم إنهاء عقودهم مع انتهاء المشروع

4. أنشطة إغلاق المشروع

كتابة التقرير النهائي للمشروع

- يلخص التقرير النهائي أداء المشروع ويقدم معلومات مفيدة للتحسين المستمر
- يشمل الموضوعات التالية
 1. الملخص التنفيذي
 2. المراجعة والتحليل
 3. التوصيات
 4. الدروس المستفادة
 5. الملاحق

5. تقييم المشروع

تقييم فريق العمل

- تقدير مدى نجاح فريق المشروع وأعضاء الفريق ومدير المشروع وتقييم أدائهم
- تقييم الأداء أمر ضروري لتشجيع التغيرات في السلوك والتحسين المستمر من خلال التعلم التنظيمي
- القياس وفقاً لمعايير محددة

✓ تحديد التوقعات والمعايير والمقاييس والثقافة التنظيمية الداعمة والقيود قبل بدء المشروع

• يشمل التقييم

- ✓ عملية بناء الفريق
- ✓ فعالية القرار الجماعي
- ✓ عمليات حل المشاكل
- ✓ تماسك المجموعة والثقة بين أعضاء الفريق
- ✓ جودة المعلومات المتبادلة

• تأخذ عملية تقييم الفريق أشكالاً متعددة

- ✓ إجراء مسح مباشر أو من خلال البريد الإلكتروني
- ✓ خبير استشاري أو موظف من قسم الموارد البشرية

5. تقييم المشروع

مراجعة أداء الأفراد وأعضاء الفريق ومدير المشروع

• التنظيم الوظيفي

- ☐ يكون المدير الوظيفي هو المسؤول عن تقييم أداء أعضاء الفريق
- ☐ قد يلتمس رأي مدير المشروع حول أداء بعض الأفراد
- ☐ اعتبار ذلك ضمن تقييم الأداء العام للفرد ضمن المنظمة

• التنظيم المصفوفي

- ☐ يتشارك مدير المشروع والمدير الوظيفي في تقييم أداء الفرد.

• التنظيم بالمشاريع

- ☐ يكون مدير المشروع هو المسؤول عن تقييم أداء أعضاء فريق العمل
- عند تقييم الأداء يجب التماس الرأي من جميع الأطراف والأشخاص الذين تأثروا بعمل الشخص أو الفريق
- ☐ مدير المشروع والمدير الوظيفي والأقران والمرؤوسين والزبائن والمستخدم النهائي

5. تقييم المشروع

مراجعة أداء الأفراد وأعضاء الفريق ومدير المشروع

• لتقييم الأداء عموماً وظيفتان

- تحديد مواطن القوة والضعف لدى الفرد ووضع خطط عمل لتحسين أدائه
- تقييم مدى إنجاز الشخص من أجل تحديد أو تعديل سوية أجره ومكافأته

• يُفضل فصل مراجعة الأداء التي تركز على تحسين أداء الفرد عن عملية المراجعة الخاصة بتوزيع المكافآت

6. الدروس والعبر المستخلصة

- تحليل يتم إجراؤه أثناء وبعد فترة وجيزة من نهاية المشروع
- لإيجاد ما يمكن تعلمه من تجربة المشروع إيجاباً أو سلباً
- ما هي الأمور التي تمت على ما يُرام؟
- ما هي الأمور التي لم تسر كما ينبغي؟ ولماذا؟
- وضع خطة عمل تضمن أن يتم استخدام الدروس المستفادة في تحسين إدارة المشاريع المستقبلية
- إعادة استخدام الحلول ووقف الأخطاء المتكررة في جميع أنحاء المنظمة
- عوائق التي تحول دون الاستفادة من الدروس
- 1. ضيق الوقت
- 2. يتم تثبيت معظم الدروس المستفادة عند اكتمال المشروع
- نادراً ما تُستخدم الدروس المستفادة أثناء تنفيذ المشروع لتحسين العمل المتبقي في المشروع.
- 3. تتحول الدروس المستفادة في كثير من الأحيان إلى جلسات لوم يكون ضررها العاطفي كبيراً
- 4. لا يتم استخدام الدروس المستفادة في المشاريع المستقبلية بسبب فشل الثقافة التنظيمية في الاعتراف بقيمة التعلم



إدارة المشاريع

Project Management

المحاضرة الرابعة عشرة: إنهاء وإغلاق المشروع

Project Closure

الدكتور إياد زوكار
